



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia “

Bambamarca, 13 de Agosto del 2021



MEMORÁNDUM N° 381 -2021-MPH-BCA/GDUYR

A : ING. MANUEL LEONCIO CRUZ MALCA
Sub Gerente de Tecnología y Sistema de la Información


ASUNTO : SOLICITO REGISTRAR INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA MPH-BCA

REFERENCIA: a) Informe N° 149-2021-MPH-BCA/ING.ENRLL/AC
b) Memorándum N° 566-2021-MPH/GM - MAD N° 1119774
c) Memorándum N° 445-2021-MPH-B/A - MAD N° 1109132
d) Oficio N° 002003-2021-CG/PC - MAD N° 1108390
e) Informe de Orientación de Oficio N° 13459-2021-CG/PC-SOO

Sirva el presente para saludarlo cordialmente, y a la vez en mérito a los documentos citados y tomando en consideración el documento de la referencia d), en el cual la Contraloría General de la República, indica que la Entidad no ha publicado en su Portal Institucional el avance mensual de los Servicios de Mantenimiento Periódico y Rutinario, así como el uso de los Recursos asignados mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, situación que afecta la transparencia, el acceso a la información pública y el control social por parte de la ciudadanía. En tal sentido se le hace llegar las acciones correctivas tomadas por los responsables de dichos Mantenimientos, como son: el cuadro informativo de los montos asignados para la ejecución de los Mantenimientos bajo el D.U. N° 070 y el detalle de los avances al año 2021. Por tal motivo, se solicita subir dicha información al Portal Web Institucional y emitir su informe de cumplimiento, con la finalidad de dar cuenta a la Contraloría.

Sin otro particular, me despido, esperando el cumplimiento con responsabilidad.

Atentamente,

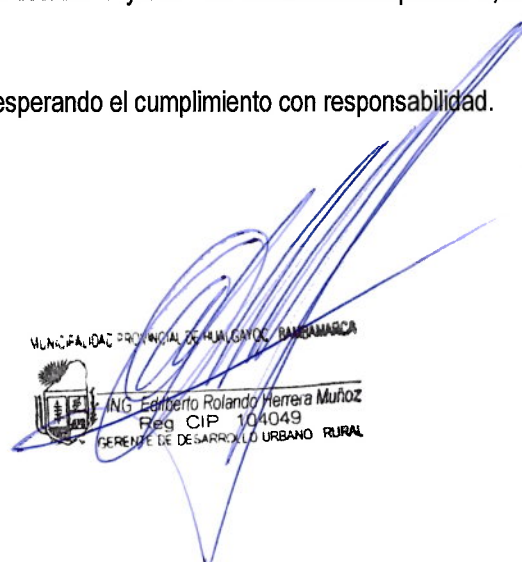MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA

ING. Gilberto Rolando Herrera Muñoz
Reg CIP 104049
GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL

C.c
Archivo





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BCA.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



INFORME N° 149-2021-MPH-BCA/ING.ENRLL/AC

A : ING. EDILBERTO ROLANDO HERRERA MUÑOZ
Gerente de desarrollo urbano y Rural - Municipalidad Provincial de
Hualgayoc - Bambamarca

DE : ING. ELMER NILTON RUIZ LLAMOCTANTA
Administrador de contratos

ASUNTO : ALCANZO INFORMACIÓN SOLICITADA PARA QUE SEA PUBLICADA EN
EL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD

REFERENCIAS a) MEMORANDUM N° 566-2021-MPH/GM


FECHA Bambamarca 13 de agosto del 2021

Por intermedio del presente me dirijo a Usted, para saludarle cordialmente y a su vez alcanzarle la INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LOS MANTENIMIENTOS PERIODICOS Y RUTINARIOS CONSIDERADOS EN EL D.U 070-2020- PARA QUE SEA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD; la cual se recomienda derivar dicha información al área de informática de la entidad para que suba la información al portal web de la institución de la municipalidad provincial de Hualgayoc- Bambamarca y a la vez comunicar a OCI, indicando que se ha tomado las acciones como es la elaboración de cuadro informativo de los montos asignados para la ejecución de los mantenimiento en D.U 070 y el detalle de avance del servicios al año 2021.

SE ADJUNTA:

- RESPUESTA AL MEMORANDUM N° 566-2021-MPH/GM

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines pertinentes.



ELMER NILTON RUIZ LLAMOCTANTA
INGENIERO CIVIL
CIP:151335
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

C.C.
ENRLL
ARCHIVO




FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad/Dependencia | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA | | | | | |
| Titular de la entidad/Responsable de la dependencia | MARCO ANTONIO AGUILAR VÁSQUEZ | | | | | |
| Número del Informe de control simultáneo | INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 13459-2021-CG/PC-SOO | | | | | |
| Modalidad del servicio de control simultáneo | ORIENTACIÓN DE OFICIO | | | | | |
| Situación adversa (Transcribir la sumilla de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe de Control Simultáneo) | Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) | Estado de la acción (*) | Plazo para adoptar acciones (Fecha fin: día/mes/año. No exceder de 3 meses) | Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar acciones | Documento Nacional de Identidad (DNI) | Órgano/unidad orgánica de la entidad/dependencia del funcionario responsable |
| LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EN SU PORTAL INSTITUCIONAL EL AVANCE MENSUAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO, ASI COMO EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020; SITUACION QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y EL CONTROL SOCIAL POR PARTE DE LA CIUDADANIA". | 1.ELABORACION DE CUADRO INFORMATIVO DE AVANCES MENSUALES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO; Y RECUSOS ASIGNADOS, CORRESPONDIENTES A LOS 10 TRAMOS INCLUIDOS EN EL D.U. N°070-2020. 2. SUBIDA DE INFORMACION AL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HULAGAYOC-BAMBAMARCA. | EN PROCESO | FECHA FIN: 24 DE AGOSTO DEL 2021. | 1. ING. EDILBERTO ROLANDO HERRERA MUÑOZ-GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. 2. ING. LEONCIO MANUEL CRUZ MALCA - SUB GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION | | 1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. 2. SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION |

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo"

- Implementada.
- No Implementada.
- En proceso.
- Pendiente.
- No aplicable.
- Desestimada.

| INFORMACION GENERAL: 10 TRAMOS INCLUIDOS EN EL D.U. 070-2020 | | | | | | COMPLETADAS AL 100% DURANTE EL AÑO 2020 | | EN EJECUCION DURANTE EL AÑO 2021 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SERVICIO | MONTO TOTAL ASIGNADO PARA EJECUCION DEL SERVICIO | Nº CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO DEL CONTRATO | LONGITUD EJECUTADA | FASE I PLAN DE TRABAJO 1% | FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO 83% | FASE III MANT. RUTINARIO (15% MC) | INVENTARIO DE CONDICION VIAL (1% MC) |
| 1 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA TRAYECTORIA: EMP. PE-3N SAMANGAY – LUCMACHUCO – SAN JUAN DE LA CAMACA – EL CAPULÍ – EMP.CA-107" | S/. 1,460,223.20 | CONTRATO DE SERVICIOS N°008-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | CONSORCIO SAMANGAY | S/. 1,118,322.56 | 16.520 | S/. 11,183.23 | S/. 928,207.72 | S/. 167,748.38 | S/. 11,183.23 |
| 2 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-107 - TALLAMAC, CC.PP. EL ROMERO, CC.PP. PUSOC" | S/. 1,291,051.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°007-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | CONSORCIO PUSOC - TALLAMAC | S/. 988,760.80 | 15.240 | S/. 9,887.61 | S/. 820,671.46 | S/. 148,314.12 | S/. 9,887.61 |
| 3 "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA TRAYECTORIA: EMP. CA-107 - SANTA ROSA – CC.PP TUCO ALTO" | S/. 623,266.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°012-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | GA & F CONSTRUCTORES SANTA ANA S.R.L. | S/. 477,332.80 | 8.000 | S/. 4,773.33 | S/. 396,186.22 | S/. 71,599.92 | S/. 4,773.33 |
| 4 "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA TRAYECTORIA: EMP. PE-3N - EL CRUCE BANCO MINERO, MOLINOPAMPA, SAN JUAN ALTO, YERBA SANTA ALTA, PINGULLO BAJO, PINGULLO ALTO Y CORTADERAS" | S/. 1,976,643.60 | CONTRATO DE SERVICIOS N°011-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | CONSORCIO VIAL COREMARCA | S/. 1,513,826.88 | 22.200 | S/. 15,138.27 | S/. 1,256,476.31 | S/. 227,074.03 | S/. 15,138.27 |
| 5 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA 109, SAN JUAN DE CUÑALES, MARCO LAGUNA, MARCO PATA, EL MARCO, CRUCE LA UNIÓN (EMPALME CON CA 1062)" | S/. 1,584,876.40 | CONTRATO DE SERVICIOS N°004-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | CONSORCIO BAMBAMARCA | S/. 1,213,789.12 | 18.036 | S/. 12,137.89 | S/. 1,007,444.97 | S/. 182,068.37 | S/. 12,137.89 |
| 6 "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA TRAYECTORIA: EMPALME CA 109, LA COLPA, ENTERADOR BAJO, EMPALME CA-1066" | S/. 1,291,051.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°009-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | V & F INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | S/. 988,760.80 | 14.180 | S/. 9,887.61 | S/. 820,671.46 | S/. 148,314.12 | S/. 9,887.61 |
| 7 "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA TRAYECTORIA: LA COLPA LA UNION DE CARACHABAMBA" | S/. 747,919.20 | CONTRATO DE SERVICIOS N°010-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | CONSORCIO J&M | S/. 715,999.20 | 8.400 | S/. 7,159.99 | S/. 594,279.34 | S/. 107,399.88 | S/. 7,159.99 |
| 8 "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA TRAYECTORIA: (EMP. PE-3N - MAYGASBAMBA - AUQUE BAJO - MORAN PATA - EMP. CA-1180)" | S/. 1,234,066.68 | CONTRATO DE SERVICIOS N°006-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | CONSORCIO VIAL TIERRA DE FE | S/. 945,118.95 | 13.860 | S/. 9,451.19 | S/. 784,448.73 | S/. 141,767.84 | S/. 9,451.19 |
| 9 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EN LA TRAYECTORIA: EMP. CA-109 - MARCO PATA. (CUÑALES ALTO, QUIILINSACUCHO, PROGRESOPAMPA Y MARCOPATA)" | S/. 556,487.50 | CONTRATO DE SERVICIOS N°003-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | F&L PERVOL SERVICIOS GENERALES SRL | S/. 532,737.50 | 6.100 | S/. 3,125.95 | S/. 442,172.13 | S/. 79,910.63 | S/. 5,327.36 |
| 10 "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA TRAYECTORIA: C.P. EL TAMBO – LANCHE BAJO – CHORRO BLANCO – HUAGARISH – PATAHUASI – YERBA BUENA]" | S/. 1,272,798.21 | CONTRATO DE SERVICIOS N°005-2020-MPH-BCA/GAF-SGL | CONSORCIO EQUIPM AYR | S/. 974,781.77 | 14.295 | S/. 9,747.82 | S/. 809,068.87 | S/. 146,217.26 | S/. 9,747.82 |
| | S/. 12,038,382.79 | | | S/. 9,469,430.38 | 136.831 | S/. 92,492.88 | S/. 7,859,627.22 | S/. 1,420,414.56 | S/. 94,694.29 |


 Elmer Nilton Ruiz Llamocanta
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 151335

| FASE III DEL SERVICIO | | | AVANCE AL 31 DE JULIO 2021- M.RUTINARIO | | | SERVICIOS DE INSPECCION 2020 - FASE II | | SERVICIOS DE INSPECCION 2021 - FASE III | | EQUIPO TECNICO DE LA MPH -BCA | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| FECHA DE INICIO MANT RUINARIO | PLAZO DE EJECUCION FASE III | FECHA DE TERMINO FASE III | VALORIZACION JULIO | % | % ACUM | MONTO TOTAL ASIGNADO PARA INSPECTORES DEL SERVICIO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | MONTO TOTAL ASIGNADO PARA INSPECTORES DEL SERVICIO 2021 | CONTRATO DE SERVICIO | MONTO TOTAL ASIGNADO PARA EQUIPO TECNICO 2020 | MONTO TOTAL ASIGNADO PARA EQUIPO TECNICO 2021 | | |
| 01/01/2021 | 365 | 31/12/2021 | S/. 14,445.00 | 8.61% | 58.89% | S/. 28,600.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000951 | S/. 21,820.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°010-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | S/ 159,000.00 | S/ 126,000.00 | | |
| 01/01/2021 | 365 | 31/12/2021 | S/. 12,771.49 | 8.61% | 58.88% | S/. 25,300.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000944 | S/. 30,700.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°006-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| 19/01/2021 | 365 | 18/01/2022 | - | - | - | S/. 25,500.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000962 | S/. 30,700.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°006-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| 27/02/2021 | 365 | 26/02/2022 | S/. 19,533.60 | 8.61% | 41.94% | S/. 33,500.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000948 | S/. 29,330.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°009-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| 12/01/2021 | 365 | 11/01/2022 | S/. 15,678.11 | 8.61% | 55.83% | S/. 31,000.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000952 | S/. 31,880.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°007-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| 01/01/2021 | 365 | 31/12/2021 | S/. 12,771.49 | 8.61% | 58.88% | S/. 25,375.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000942 | S/. 29,820.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°005-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| 19/01/2021 | 365 | 18/01/2022 | S/. 9,248.32 | 8.61% | 53.89% | S/. 25,500.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000962 | S/. 29,820.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°005-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| 13/01/2021 | 365 | 12/01/2022 | S/. 12,207.79 | 8.61% | 55.56% | S/. 24,200.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000978 | S/. 35,100.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°008-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| 23/01/2021 | 365 | 22/01/2022 | S/. 6,881.19 | 8.61% | 52.77% | S/. | - | S/. 31,880.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°007-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| 12/01/2021 | 365 | 11/01/2022 | S/. 12,590.93 | 8.61% | 55.83% | S/. 25,000.00 | ORDEN DE SERVICIO N° 0000949 | S/. 35,100.00 | CONTRATO DE SERVICIOS N°008-2021-MPH-BCA- GAF/SGL | | | | |
| | | | | | | S/. 218,475.00 | | S/. 178,650.00 | | | | S/ 159,000.00 | S/ 126,000.00 |


 Elnor Nilton Ruiz Llamocanta
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 151335
